


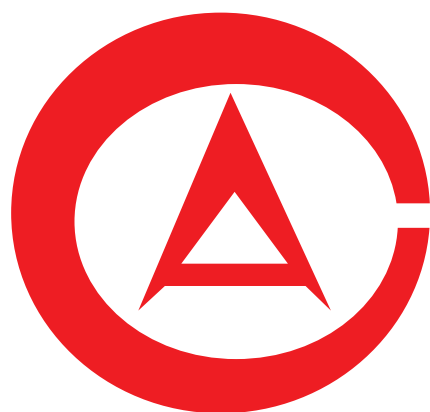

惠 州 市 审 计 局

审计结果公告

HUIZHOU SHI SHENJIJU
SHENJIJIEGUO GONGGAO

2019年 第2号

(总第19号)

惠 州 市 健 康 十 大 工 程 跟 踪 审 计 调 查 的 审 计 结 果	1
--	---

惠州市健康十大工程跟踪审计调查的审计结果

(2019 年10 月 14日公告)

根据市委市政府要求和 2018 年度审计项目计划安排,2018 年 4 月至 12 月,惠州市审计局对惠州市健康十大工程进行了跟踪审计调查。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

惠州市卫生与健康十大工程(下称“十大工程”)主要包括惠州健康城建设工程(综合医院、儿童医院、心血管病医院、眼科医院、市中心血站、医学教研培训中心)、市第一人民医院扩建工程、市中心人民医院鹅岭院区三期工程、惠州市两家专科医院建设工程(惠州市第五人民医院、惠州市皮肤病医院)、惠州市第二人民医院和惠州市复退军人医院共建共享建设工程、惠州市村卫生站标准化建设工程、惠州市高水平县(区)医院建设工程、惠州市乡镇卫生院强基提质建设工程、惠州市社区卫生服务中心标准化建设工程和惠州市互联网+医疗创新平台建设工程。

二、审计发现的主要问题

(一) 21 个工程项目建设进度缓慢

因规划或建设规模调整等原因,龙门县中医医院、妇幼保健院和中医馆(蓝田)标准化建设,惠城区中医医院江北新院、市第

二妇幼保健院上排院区扩建项目未按计划开工，惠州市特殊人员羁留医院，仲恺高新区潼湖镇永平村卫生站，惠东县人民医院迁建项目和马山、增光、巽寮、盐洲 4 家卫生院中医馆未按计划完工，市第一人民医院扩建项目、惠州健康城建设工程、大亚湾区中大惠亚医院二期、惠东县多祝镇卫生院升级建设项目进展缓慢。

（二）11 个项目建设管理不到位

1. 设计阶段使用单位考虑不周导致已完工程返工拆除，造成损失浪费 161 万元。仲恺高新区人民医院在该医院建设项目施工图设计阶段考虑不周，导致已完工程返工拆除，造成损失浪费 161 万元。

2. 合同约定的部分实质性条款与招标文件相背离。惠东县祝镇卫生院升级建设项目，工程监理合同约定的监理费支付条款与招标文件不一致，导致超付监理费 58 万元。

3. 部分工程建成后闲置未及时发挥效益，涉及投资 238 万元。仲恺高新区已建成的永平村、黄屋村、红岗村、观田村、青春村、胜利村、罗村、英光村、君子营等 9 间镇村卫生服务一体化卫生站，因医疗人员未到位、医疗设备尚未采购等原因，闲置近 1 年未投入使用，已投入的 238 万元建设资金未及时发挥效益。

（三）医疗设备采购价格管理机制不完善

惠州市特殊人员羁留医院项目、博罗妇幼保健院项目同期采

购同型号的全数字高档彩色多普勒超声诊断系统，使用单位确定的采购限价存在差异，分别为 177 万元、148 万元，导致实际采购价格存在差异，分别为 170 万元、148 万元。

三、审计处理意见和建议

针对审计发现的问题，市审计局已依法出具了审计报告，并将审计结果提交惠州市审计执法联席会议。同时，市审计局建议相关单位加大工程项目建设推进力度，保障民生项目如期建成、发挥效益；认真履行建设管理与监督职责，强化项目现场监管；加强医疗设备采购外部监管，完善医疗设备采购价格管理机制。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，市卫生和计生局高度重视，积极落实整改，有关问题已基本整改到位。

主办：惠州市审计局法规审理科

地址：惠州市云山西路6号惠州市行政中心5号楼7楼

邮编：516003

电话：0752-2809413

网址：<http://sjj.huizhou.gov.cn>
